LEGENDA

- Delimitazione Lotto 4
- Demolizioni
- Costruzioni
- Opere preliminari di pulizia dell'area ad opera di soggetto privato
- Alberatura esistente : riposizionata
- Alberatura esistente : mantenuta

Rimuovere recinzione esistente in jersey e lamiere e sostituire con recinzione di cantiere con pannelli prefabbricati di rete elettrosaldata (h min 2 metri) zavorrati a terra con zavorra, rivestiti con rete arancio, la recinzioni chiuderà un tratto di passeggiata pubblica per l'intera durata del cantiere

Prima dello scavo di sbancamento per il muro di contenimento rimuovere i jersey lungo il fronte scavo dello sbancamento, posare un parapetto robusto arretrato 1,5 metri dal fronte dello scavo

Realizzare robusto parapetto l'ungo il fronte di scavo

Realizzare recinzione di cantiere con pannelli prefabbricati di rete elettrosaldata (h min 2 metri) zavorrati a terra con doppia zavorra, rivestiti con telo ombra e rete arancio, segnalare recinzione con lampade a luce rossa fissa posate lungo la recinzione ogni 4 m ad un' altezza di 1,5 m. Questa recinzione dovrà essere realizzata nell'ultima fase del cantiere, quando, come da cronoprogramma è prevista la posa della segnaletica stradale. La recinzione deve essere sufficientemente ampia da incorporare un'autogru per la movimentazione del portale fisso e lo scavatore per lo scavo necessario alla posa dei plinti del portale

Lasciare libero il passaggio sul marciapiede

Posare Recinzione mobile costituita da pannelli ciechi standard allezza 2 metri, in lamiera zincata comprensiva di elementi base prefabbricati di calcestruzzo per il fissaggio dei pannelli, segnalare recinzione con lampade a luce rossa fissa posate lungo la recinzione ogni 3,5 m ad un' altezza di 1,5 m.

Realizzare recinzione di cantiere con pannelli prefabbricati di rete elettrosaldata (h min 2 metri) zavorrati a terra con doppia zavorra, rivestiti con telo ombra e rete arancio, segnalare recinzione con lampade a luce rossa fissa posate lungo la recinzione ogni 4 m ad un' altezza di 1,5 m.

Realizzare passaggio pedonale protetto

Si preveda la posa di un ponteggio a monte e a valle del muro da realizzare per tutta la sua lunghezza

Area lavaggio betoniere

La recinzione in muratura di mattoni e jersey dovrà essere rimossa prima delle realizzazione dello scavo della nuova rete fognaria.

Posare Recinzione mobile costituita da pannelli ciechi standard allezza 2 metri, in lamiera zincata comprensiva di elementi base prefabbricati di calcestruzzo per il fissaggio dei pannelli, segnalare recinzione con lampade a luce rossa fissa posate lungo la recinzione ogni 3,5 m ad un' altezza di 1,5 m.

Realizzare un parapetto lungo lo scavo da entrambi i lati ad almeno un metro di distanza dal ciglio dello scavo

VIA R.SERRA

VIA GARDELLA

Lasciare libero il passaggio sul marciapiede

Realizzare recinzione di cantiere con pannelli prefabbricati di rete elettrosaldata (h min 2 metri) zavorrati a terra con doppia zavorra, rivestiti con telo ombra e rete arancio, segnalare recinzione con lampade a luce rossa fissa posate lungo la recinzione ogni 4 m ad un' altezza di 1,5 m. Questa recinzione dovrà essere realizzata nell'ultima fase del cantiere, quando, come da cronoprogramma è prevista la posa della segnaletica stradale. La recinzione deve essere sufficientemente ampia da incorporare un'autogru per la movimentazione del portale fisso e lo scavatore per lo scavo necessario alla posa dei plinti del portale

Posare birilli lungo il confine con il marciapiede durante la posa della segnaletica a terra

Posare Recinzione mobi
standard altezza 2 metri,
elementi base prefabbric
pannelli

Rimuovere recinzion
con recinzione di ca
ellettrosaldata (h m
rivestiti con rete ara
passeggiata pubblic

SEZIONE TIPO SCAVO ARMATO PER NUOVA CONDOTTA FOGNARIA (Sezione A-A)

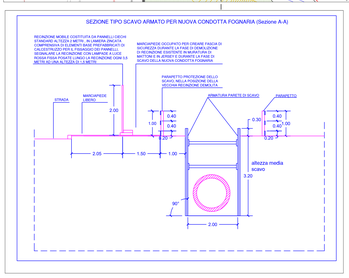

SEZIONE TIPO CANTIERE A CONFINE CON IL MARCIAPIEDE

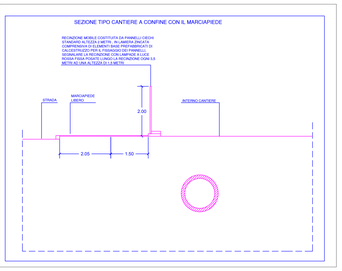

LEGENDA LAY OUT DI CANTIERE

1 PASSO CARRAIO, INGRESSO E USCITA AUTOCARRI
DI CANTIERE, AFFIGGERE CARTELLO MULTI INFIORMAZIONE, NOTIFICA PRELIMINARE E CARTELLO DI CANTIERE, AFFIGGERE CARTELLONISTICA PER EMERGENZA COVID 19
(*)

(*)

(*)

2 BARACCA DI CANTIERE ADIBITA AD UFFICIO CON BAGNO E LAVABO (dimensioni indicative 9,12 m per 2,44 m)
3 BARACCA DI CANTIERE ADIBITA A BAGNO CON LAVABI E WC (dimensioni indicative 6,06 m per 2,44 m)
4 QUADRO ELETTRICO DI CANTIERE
5 BARACCA DI CANTIERE ADIBITA A MAGAZZINO E DEPOSITO MATERIALI (dimensioni indicative 6,06 m per 2,44 m)
6 COLLEGAMENTO UFFICIO DI CANTIERE E BAGNI A RETE FOGNARIA DI CANTIERE CON POSA DI CISTERNA IN PLASTICA DA 3000 litri A RACCOLTA DEI LIQUAMI
7 COLLEGAMENTO UFFICIO DI CANTIERE E BAGNI A RETE IDRICA CITTADINA
8 SOTTO - QUADRO ELETTRICO
9 TETTOIA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL' ALTO , PER PROTEZIONE SPAZIO TAGLIO CON TAGLIERINA
10 ZONA STOCCAGGIO DEPOSITO MATERIALI, RECINTATA CON RECINZIONE IN RETE ZINCATA, ZAVORRATA A TERRA , RIVESTITA IN RETE ARANCIO DA CANTIERE
11 INGRESSO PEDONALE LARGHEZZA 2 METRI

RECINZIONE DI CANTIERE CON PANNELLI PREFABBRICATI IN RETE ELETTROSLADATA (H MIN 2 METRI) ZAVORRATI A TERRA CON DOPPIA ZAVORRA, RIVESTITI CON TELO OMBRA, E RETE ARANCIO, SEGNALARE CON LAMPADE A LUCE ROSSA FISSA POSATE LUNGO LA RECINZIONE OGNI 4 METRI AD UN'ALTEZZA DI 1,5 METRI

RECINZIONE MOBILE COSTITUITA DA PANNELLI CIECHI STANDARD ALTEZZA 2 METRI , IN LAMIERA ZINCATA COMPRENSIVA DI ELEMENTI BASE PREFABBRICATI DI CALCESTRUZZO PER IL FISSAGGIO DEI PANNELLI, SEGNALARE LA RECINZIONE CON LAMPADE A LUCE ROSSA FISSA POSATE LUNGO LA RECINZIONE OGNI 3,5 METRI AD UNA ALTEZZA DI 1,5 METRI

PARAPETTO REALIZZATO CON TRAVETTI DI LEGNO INFISSI NEL TERRENO SEZIONE 10*10 cm A INTERVALLI DI 1,5 m E ASSI DI LEGNO SPESSORE 3 CM

LUCE FISSA ROSSA — LUCE FISSA GIALLA — BIRILLI

ESTINTORE — CASSETTA PRIMO SOCCORSO — PUNTO DI RACCOLTA

Area di progetto

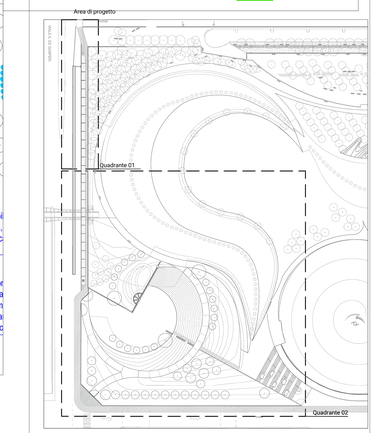

K-PLAN

METRI 0 2 4 10 — 1:200

Accordo di programma Progetto Portello
Programma integrato di intervento ai sensi della L.R. 12 Aprile 1999, n.9

Parco pubblico - completamento fase 4

Atto integrativo convenzione attuativa -U2/U3 - Comune di Milano
PROGETTO ESECUTIVO

Il Committente

IPER MONTEBELLO S.P.A.
Sede legale
via Andrea Ponchelli, 7
Sede operativa
via Ponchelli, 7
Milano

Progettazione paesaggistica

ARCH. CHARLES JENCKS
19, Landsdowne
London - W11QMH
T. 442075276216

Progettazione paesaggistica

LAND Italia Srl
via Vanvitelli 15
IT - 20131 Milano
+39 02 80691111
italia@landsrl.com

Progettazione idraulica

STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROGETTAMBIENTE
via dei Cerosa,n.5
26100 CREMONA
+39 0372 557885
info@progettambiente.eu

Progettazione elettrica

PERITO INDUSTRIALE FABRIZIO SICCHERO
VIA BRUNO BUOZZI, 13
20026 NOVATE MILANESE (MI)
FABRIZIO.SICCHERO@GMAIL.COM
+39 3402809891

Progettazione strutturale

L2 PROGETTI
SOCIETA' DI INGEGNERIA
via dell'Industria,14, 58
25030 ERBUSCO (Brescia)
+0039 030 7706713
info@L2progetti.it

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione :

ING. ALEX CAPPA
via Dorneri, 25
25070 BARGHE (Brescia)
0365 - 624427 / 335393638
cappa_alex@yahoo.it

Rev.	Data	Oggetto	Org.	Ver.	Appr.
01	03-07-2020	Seconda emissione			
00	27-06-2020	Prima emissione	FSI	FSI	FSI

n. elaborato
F_D.06

Titolo
Layout di cantiere

Scala

Questo documento può essere utilizzato esclusivamente per lo finalità previste dal contratto in base al quale lo stesso è stato fornito. la riproduzione, la modifica e comunque ogni utilizzo per finalità diverse sono vietate in assenza di preventiva autorizzazione da parte LAND Italia Srl. il contenuto del documento e' protetto dalle norme sul diritto d'autore e sulla proprietà intellettuale.

01 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO
1:200
